



Woubrugge integraal 2024-2030



Projecten in beeld

Programma

- Overzichtskaart projecten
- Faseringskaart (Liander)
- Uitwerking per project

Overzichtkaart projecten


Alle lopende projecten in Woubrugge op de kaart

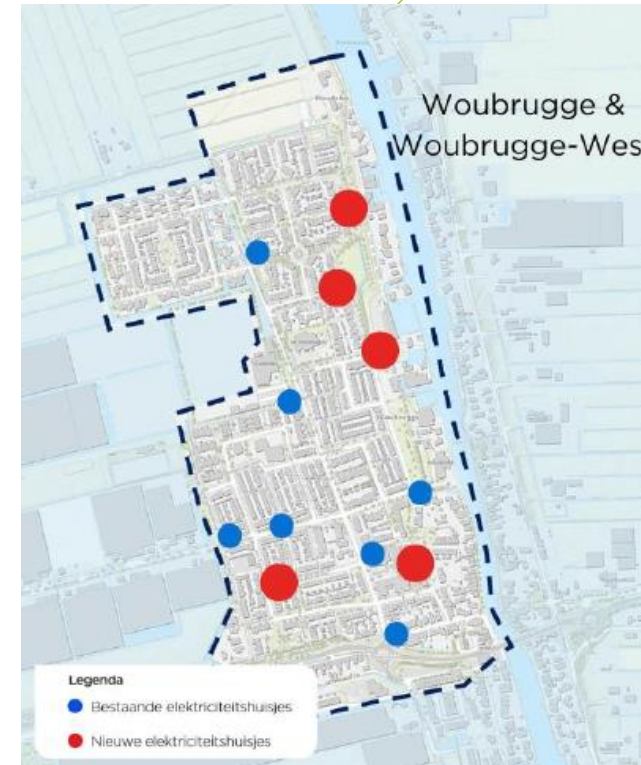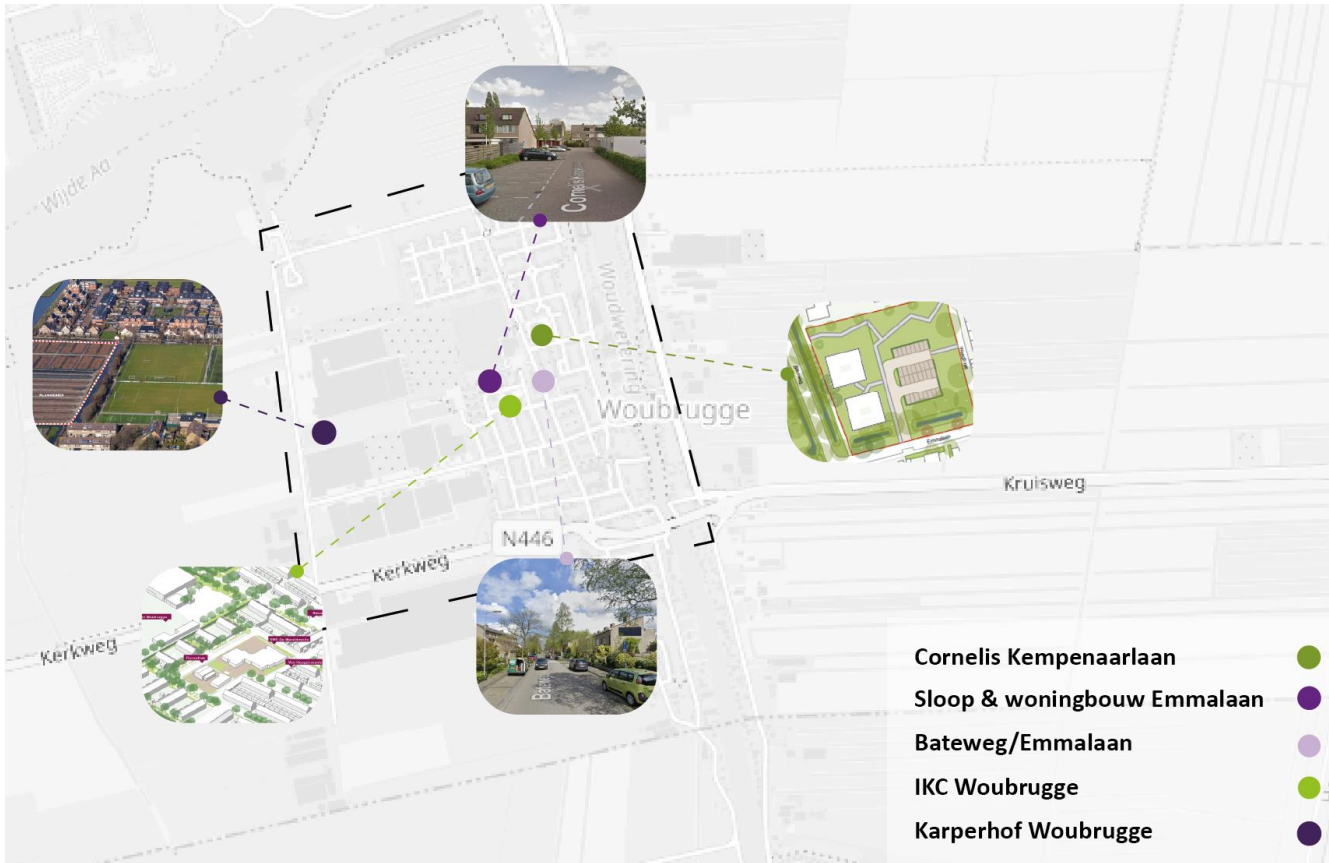

Liander LS & Trafo's

Overzichtkaart projecten

Projecten ingedeeld in categorie

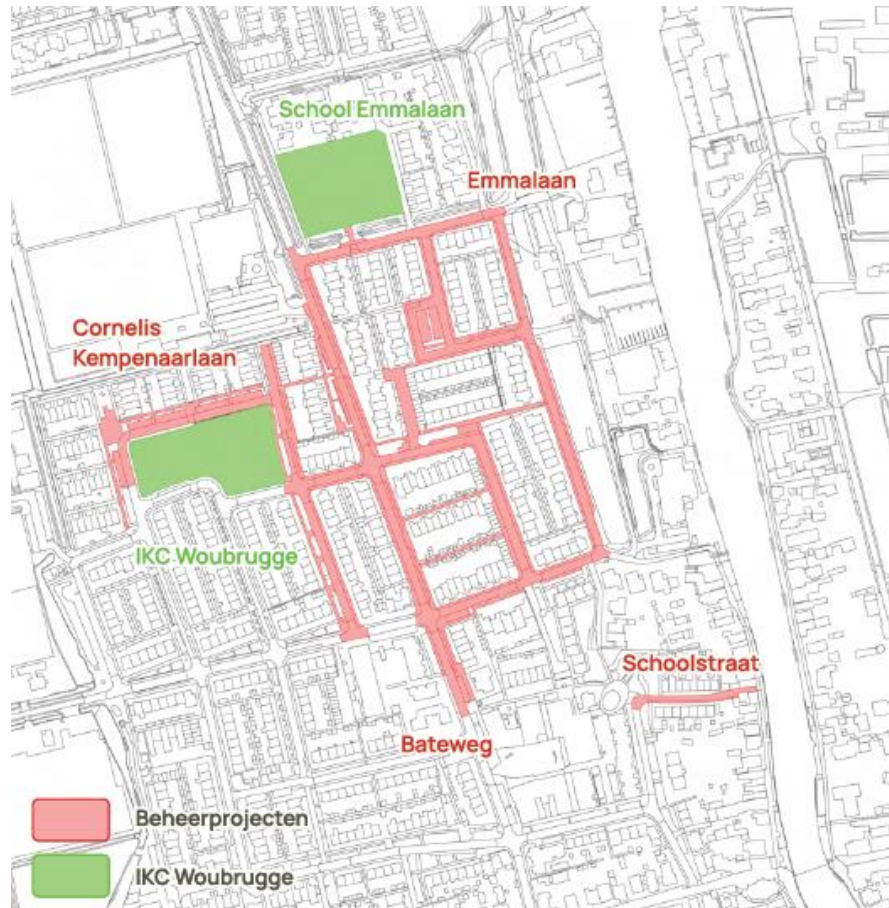

IKC Woubrugge

- 1) Sloop basisschool Cornelis Kempenaarlaan
- 2) Realisatie IKC
- 3) Sloop basisschool Emmalaan
- 4) Bouwrijp maken Emmalaan
- 5) Woningbouw Emmalaan

Beheerprojecten

- 1) Reconstructie Bateweg & Schoolstraat
- 2) Reconstructie Emmalaan, Julianalaan & Wilhelminalaan
- 3) Reconstructie Cornelis Kempenaarlaan

Overige

- 1) Karperhof Woubrugge
- 2) Liander LS & Trafo's

Faseringskaart (Liander)


Projecten weggezet in fases

Fase 5 – Medio Q3 2026

Fase 1 – Medio Q2 2025

- 1) Cornelis Kempenaarlaan
- 2) IKC Woubrugge
- 3) Bateweg

Fase 4 – Medio Q2 2026

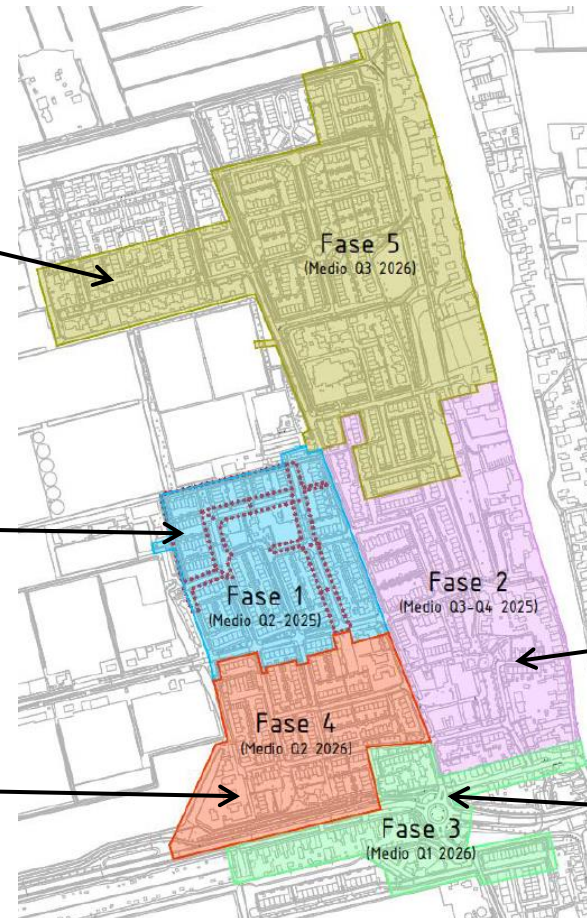

Fase 2 – Medio Q3/Q4 2025


- 1) Bateweg
- 2) Emmalaan

Fase 3 – Medio Q1 2026

Liander LS & Trafo's

Looptijd
Huidige Fase


Start begin 2025 – gereed eind 2026
Vorbereiding/Uitvoering

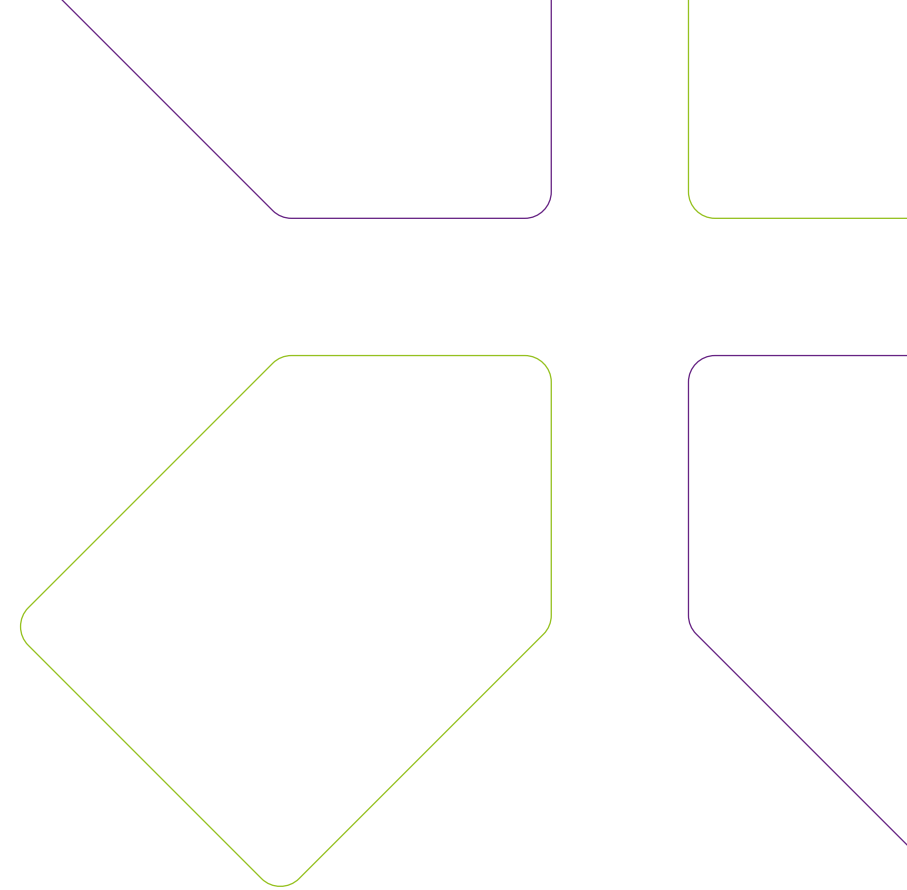







Bateweg/Emmalaan

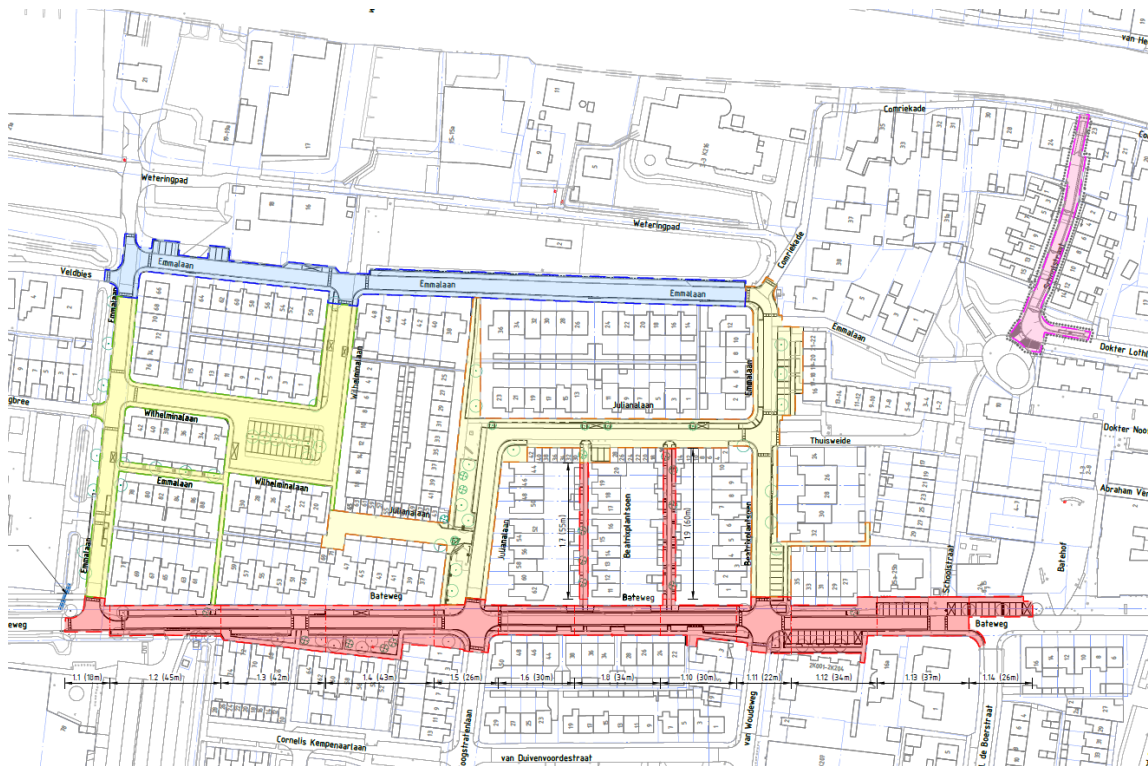Looptijd
Huidige fase

(Gewenste) Start Q2 2025 – gereed eind 2026
DO/bestek



Legenda

-  fase 1 Bateweg en 2x hofjes Beatrixplantsoen
 -  fase 2 Julianalaan e.o. en deel Emmalaan (huisnr 2 t/m 12)
 -  fase 3 Wilhelminalaan en deel Emmalaan (noordelijk deel)
 -  fase 4 Emmalaan (huisnr 14 t/m 66)
 -  Schoolstraat werkzaamheden (bestek) niet gekoppeld aan project Bateweg e.o.
-  1:xx (-m)
werkvaknummer, is werk volgorde (met lengte)

Cornelis Kempnaerlaan

Looptijd
Huidige Fase

Start april/mei 2025 – gereed eind 2025/begin 2026
Vorbereiding/Uitvoering



LEGENDA

	Bestaande situatie
	Projectgebied
	Ketenterrein (ca. 250m ²)
	Grond-/materiaaldepot (ca. 300m ²)
	F1 Fase 1
	F2 Fase 2
	F3 Fase 3
	F4 Fase 4
	F5 Fase 5
	F6 Fase 6
	F7 Fase 7
	F8 Fase 8
	F9 Fase 9

IKC Woubrugge

Looptijd
Huidige fase

Start uitvoering half 2026 – oplevering half 2027
Ontwerpfase - SO door architect



Sloop & woningbouw Emmalaan

Looptijd
Huidige Fase

Start half 2027 – gereed eind 2028
Herziening SPVE



Karperhof Woubrugge

Looptijd
Huidige fase

RVS loopt, verwachting ontwikkelaar koers half 2026 start
Bestemmingsplan loopt/ voorbereiding uitvoering

